



Optimización de Distribución y Planificación Temporal en Planta Embotelladora de Agua Purificada

Proyecto Académico Segundo Parcial

Estudiantes: Cobos Taco Alison Marcela
Lagua Flores Henry Daniel
Peña Aguilar Javier Aldair
Supe Palate Pedro Daniel

Docente: Mat. Inti Becerra, Mg.

Fecha: Mayo 2026

Período: Enero 2026 – Julio 2026

Lugar: Ambato – Ecuador

Índice

Resumen	3
1. Información general del proyecto	4
1.1. Datos básicos	4
1.2. Objetivos del proyecto	4
1.3. Contexto del problema	4
2. Parte 1: Modelo de transporte	5
2.1. Descripción del problema	5
2.2. Datos proporcionados	5
2.2.1. Capacidad de producción (miles de litros/semana)	5
2.2.2. Costos de transporte (\$/miles de litros)	5
2.3. Modelo de transporte	5
2.3.1. Formulación matemática	5
2.3.2. Tabla de resultados (matriz de envíos)	6
2.3.3. Análisis de sensibilidad (al menos una variación)	7
2.3.4. Gráfico de flujos	8
2.4. Interpretación general de resultados	8
3. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM)	10
3.1. Descripción del problema	10
3.2. Tabla de Actividades	10
3.3. Diagrama de red	10
3.4. Tabla PERT/CPM	10
3.5. Diagrama de Gantt	10
3.6. Análisis de cumplimiento de plazo	10
4. Conclusiones y recomendaciones	10
4.1. Resumen de hallazgos	10
4.2. Recomendaciones operativas	11
4.3. Limitaciones del estudio	11
Anexos	13



Resumen

El presente proyecto aplica técnicas de Investigación de Operaciones para optimizar la logística de distribución de una planta embotelladora de agua purificada [1]. Para el análisis computacional y la resolución del problema logístico, se empleó el entorno de programación y software estadístico R [2]. La implementación técnica se apoyó en el uso de librerías especializadas, destacando principalmente **lpSolve** para la resolución del modelo de optimización, e **igraph** junto con **ggplot2** para la construcción de los diagramas de red y representaciones gráficas.

En la primera parte del estudio, se formuló y resolvió un **modelo de transporte** mediante **Programación Lineal** [3]. El objetivo central consistió en minimizar los costos semanales de distribución desde 3 plantas de producción hacia 4 centros de distribución, con una oferta y demanda perfectamente balanceadas de 150 miles de litros por semana. Tras el procesamiento de los datos con **lpSolve**, el modelo arrojó una solución óptima factible que establece un **costo mínimo de \$1 180 por semana**, activando únicamente 5 de las 12 rutas posibles y operando las tres plantas al 100 % de su capacidad. Adicionalmente, se realizó un análisis de sensibilidad que evidenció que un incremento de apenas 10 miles de litros en la demanda de CD4 tornaría el sistema infactible, lo que subraya la necesidad de planificar con anticipación la expansión de la capacidad productiva [4].

En la segunda parte, se aplicó la metodología **PERT/CPM** al proyecto de instalación de una nueva red de distribución [5], compuesto por 7 actividades con relaciones de precedencia secuenciales y paralelas. Mediante el diagrama de red AOA, el recorrido progresivo (*Forward Pass*) y el recorrido regresivo (*Backward Pass*), se determinó que la duración total del proyecto es de **20 días hábiles**, cumpliendo ampliamente con el límite máximo establecido de 40 días y contando con una holgura global de 20 días. La ruta crítica identificada es **A → B → D → E → F → G**, conformada por 6 de las 7 actividades, siendo la actividad **C** (Instalación en CD1) la única con holgura interna de 2 días.



1. Información general del proyecto

1.1. Datos básicos

Asignatura	Investigación de Operaciones
Plazo de entrega	4 semanas
Formato de entrega	Informe técnico + Código R
Herramienta obligatoria	R (lpSolve, igraph, ggplot2)
Tipo de trabajo	Grupal

1.2. Objetivos del proyecto

Al completar este proyecto, el estudiante es capaz de:

1. Formular un problema de transporte como un modelo de Programación Lineal [1].
2. Implementar la solución en R con el paquete lpSolve [2].
3. Calcular tiempos tempranos, tardíos, holguras y ruta crítica con PERT/CPM [5].
4. Interpretar los resultados en términos de costos y tiempos.
5. Presentar conclusiones ejecutivas con soporte gráfico.

1.3. Contexto del problema

Una planta embotelladora de agua purificada tiene **3 centros de producción** (Plantas A, B y C) y debe abastecer a **4 centros de distribución (CD1–CD4)**. Adicionalmente, debe ejecutar un proyecto de instalación de una nueva red de distribución compuesto por 7 actividades secuenciales y paralelas.

2. Parte 1: Modelo de transporte

2.1. Descripción del problema

Se debe determinar cuántos miles de litros enviar desde cada planta a cada CD para **minimizar el costo total de transporte** [1], respetando las capacidades máximas de producción de cada planta y satisfaciendo la demanda mínima de cada centro de distribución.

2.2. Datos proporcionados

2.2.1. Capacidad de producción (miles de litros/semana)

Planta	Capacidad
A	50
B	60
C	40
Total	150

CD	Demanda
CD1	30
CD2	45
CD3	35
CD4	40
Total	150

Observación

La oferta total (150) es igual a la demanda total (150): el problema está **balanceado**, por lo que no es necesario agregar una planta o CD ficticio [1].

2.2.2. Costos de transporte (\$/miles de litros)

A continuación se presenta la matriz de costos unitarios de transporte (en dólares por cada mil litros), la cual refleja el costo asociado a cada posible ruta entre las tres plantas de producción y los cuatro centros de distribución. Estos valores constituyen los coeficientes de la función objetivo del modelo de programación lineal y son determinantes para identificar las rutas más eficientes [3].

Origen \ Destino	CD1	CD2	CD3	CD4
Planta A	8	6	10	9
Planta B	9	12	13	7
Planta C	14	9	16	5

Tabla 1: Costos de transporte.

2.3. Modelo de transporte

2.3.1. Formulación matemática

El modelo de transporte es una clase especial de problema de programación lineal cuya estructura permite resolverlo de manera eficiente [1], [3].

Variables de decisión:

x_{ij} = miles de litros desde Planta i hacia CD j con $i \in \{A, B, C\}$, $j \in \{1, 2, 3, 4\}$

Función objetivo:

$$\text{mín } Z = \sum_{i \in \{A, B, C\}} \sum_{j=1}^4 c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

Expandida:

$$\begin{aligned} \text{mín } Z = & 8x_{A1} + 6x_{A2} + 10x_{A3} + 9x_{A4} \\ & + 9x_{B1} + 12x_{B2} + 13x_{B3} + 7x_{B4} \\ & + 14x_{C1} + 9x_{C2} + 16x_{C3} + 5x_{C4} \end{aligned}$$

Restricciones de oferta (no exceder capacidad):

$$x_{A1} + x_{A2} + x_{A3} + x_{A4} \leq 50 \quad (\text{Planta A}) \quad (2)$$

$$x_{B1} + x_{B2} + x_{B3} + x_{B4} \leq 60 \quad (\text{Planta B}) \quad (3)$$

$$x_{C1} + x_{C2} + x_{C3} + x_{C4} \leq 40 \quad (\text{Planta C}) \quad (4)$$

Restricciones de demanda (satisfacer mínimo requerido):

$$x_{A1} + x_{B1} + x_{C1} \geq 30 \quad (\text{CD1}) \quad (5)$$

$$x_{A2} + x_{B2} + x_{C2} \geq 45 \quad (\text{CD2}) \quad (6)$$

$$x_{A3} + x_{B3} + x_{C3} \geq 35 \quad (\text{CD3}) \quad (7)$$

$$x_{A4} + x_{B4} + x_{C4} \geq 40 \quad (\text{CD4}) \quad (8)$$

No negatividad:

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i \in \{A, B, C\}, j \in \{1, 2, 3, 4\} \quad (9)$$

2.3.2. Tabla de resultados (matriz de envíos)

Tras la resolución del modelo mediante el paquete `lpSolve` en R [2], se obtiene la siguiente matriz de envíos óptimos, la cual indica la cantidad exacta (en miles de litros por semana) que debe enviarse desde cada planta hacia cada centro de distribución para minimizar el costo total de transporte. Las celdas resaltadas corresponden a las rutas activas seleccionadas por el algoritmo.

Planta \ CD	CD1	CD2	CD3	CD4	Total
Planta A	0	45	5	0	50
Planta B	30	0	30	0	60
Planta C	0	0	0	40	40
Total	30	45	35	40	150

Tabla 2: Matriz de envíos óptimos (miles de litros/semana). Verde: rutas activas.

Rutas activas y costos:

Con base en la solución óptima obtenida, el siguiente cuadro detalla únicamente las cinco rutas que el modelo activó de las doce posibles, especificando el volumen transportado, el costo unitario aplicado y el costo parcial generado por cada ruta. Las siete rutas restantes fueron descartadas por presentar costos unitarios superiores a las alternativas seleccionadas.



Ruta	Cantidad (miles L)	\$/mil L	\$ Total
Planta A → CD2	45	6	270
Planta A → CD3	5	10	50
Planta B → CD1	30	9	270
Planta B → CD3	30	13	390
Planta C → CD4	40	5	200
Total	150	—	1 180

Tabla 3: 5 rutas activas (de 12 posibles). Las 7 rutas inactivas tienen costos superiores.

Verificación de restricciones:

- **Oferta:** Todas las plantas envían al 100 % de su capacidad (50, 60, 40).
- **Demanda:** Todos los CDs reciben exactamente lo que demandan (30, 45, 35, 40).
- **No negatividad:** Todos los envíos son mayor o igual a 0.

Resultado

Costo mínimo total: \$1 180 por semana

2.3.3. Análisis de sensibilidad (al menos una variación)

Escenario: Aumento de demanda en CD4 de 40 a 50 mil litros/semana

Con el fin de evaluar la robustez del modelo ante variaciones en la demanda, se analiza el siguiente escenario: un incremento en el requerimiento del CD4 de 40 a 50 miles de litros por semana. El cuadro comparativo muestra el impacto de dicho cambio sobre la factibilidad del sistema y el costo mínimo calculado.

Métrica	Escenario base	CD4 = 50	Diferencia
Oferta total (miles L)	150	150	0
Demanda total (miles L)	150	160	+10
Estado	Factible	Infactible	—
Costo mínimo (\$/semana)	1 180	No existe	—

Tabla 4: Análisis de sensibilidad: variación de demanda en CD4.

Conclusión del análisis: El sistema se vuelve **infactible** cuando la demanda de CD4 alcanza 50 miles de litros, ya que la capacidad total de producción (150) resulta insuficiente para satisfacer la demanda total de 160 miles de litros. Esta limitación crítica requiere intervención inmediata [1].

Recomendaciones:

1. **Ampliar capacidad productiva:** Incrementar la producción de la Planta C en al menos 10 mil litros/semana. Esta opción es más económica (costo marginal: \$5/mil L hacia CD4, el menor de la matriz) comparada con otras plantas.
2. **Renegociar demanda:** Si la ampliación no es viable, contactar a CD4 para ajustar sus requerimientos a la capacidad disponible o establecer entregas escalonadas.
3. **Diversificar proveedores:** Evaluar acuerdos con terceros para abastecer parte de la demanda de CD4 en períodos de picos.

2.3.4. Gráfico de flujos

Con el propósito de facilitar la comprensión visual de la solución obtenida, la siguiente figura representa de forma esquemática los flujos de distribución óptimos entre las plantas productoras y los centros de distribución. Cada flecha indica una ruta activa, acompañada del volumen transportado en miles de litros y el costo total generado por dicha ruta, permitiendo identificar de un vistazo la estructura logística resultante del modelo de optimización.

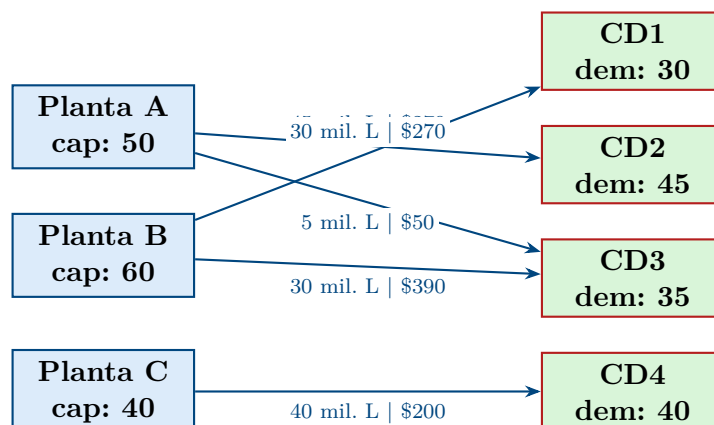


Figura 1: Flujos óptimos de distribución. Cada flecha muestra volumen (miles de litros) y costo (\$).

Interpretación:

- **Planta A** abastece CD2 (ruta más eficiente, \$6/mil L) y complementa CD3.
- **Planta B** cubre CD1 (\$9) y CD3 (\$13), siendo la planta con mayor volumen total.
- **Planta C** se especializa exclusivamente en CD4 (\$5), el costo mínimo de toda la tabla.
- Las 7 rutas inactivas (A→CD1, A→CD4, B→CD2, B→CD4, C→CD1, C→CD2, C→CD3) tienen costos mayores a las alternativas seleccionadas por el algoritmo de optimización.

2.4. Interpretación general de resultados

Con los resultados obtenidos tras la resolución del modelo de programación lineal, es posible afirmar que el sistema logístico opera de manera eficiente bajo un esquema de especialización por ruta. En primer lugar, la **Planta B** se posiciona como el nodo de mayor volumen de despacho semanal, al enviar un total de 60 miles de litros (equivalente al 40 % del flujo total), cubriendo los centros CD1 y CD3 con costos unitarios de \$9 y \$13 por mil litros respectivamente. Por su parte, la ruta de mayor volumen individual corresponde a **Planta A** → **CD2**, con 45 miles de litros transportados al menor costo unitario de toda la matriz (\$6/mil L); a esto se suma el envío complementario de 5 miles de litros desde la misma Planta A hacia CD3, con lo que esta planta agota el 100 % de su capacidad disponible. En cuanto a la **Planta C**, el modelo la especializa de forma exclusiva



en el abastecimiento de CD4, concentrando la totalidad de su producción (40 miles de litros) en esa única ruta, dado que presenta el costo más bajo de toda la tabla hacia ese destino (\$5/mil L); sus costos hacia los demás centros (\$14, \$9 y \$16) son notablemente más elevados, lo que justifica plenamente dicha especialización.

En contraste, las siete rutas que el algoritmo de optimización decidió no activar presentan, en todos los casos, costos unitarios superiores a las alternativas seleccionadas dentro de cada columna de destino. Concretamente, las rutas **Planta A** → **CD1** (\$8) y **Planta C** → **CD1** (\$14) fueron descartadas frente a la opción **Planta B** → **CD1** (\$9), que si bien no es la más barata hacia CD1 de forma aislada, resulta la más conveniente en el contexto global del modelo al liberar a las otras plantas para rutas aún más eficientes. De igual manera, las rutas **Planta B** → **CD2** (\$12) y **Planta C** → **CD2** (\$9) quedaron inactivas dado que la Planta A cubre CD2 al costo mínimo absoluto de la tabla (\$6). Las rutas **Planta C** → **CD3** (\$16), **Planta A** → **CD4** (\$9) y **Planta B** → **CD4** (\$7) también fueron excluidas, siendo esta última particularmente notable: aunque \$7 representa un costo bajo hacia CD4, el modelo prioriza asignar la Planta B a CD1 y CD3, donde su contribución al costo global es más favorable que redirigirla hacia CD4, destino que puede ser cubierto de manera más económica por la Planta C a \$5. Esto demuestra que la optimización no actúa ruta por ruta de forma aislada, sino que evalúa simultáneamente todas las asignaciones para minimizar el costo total del sistema.

Como conclusión integral de esta primera parte, el modelo confirma que es posible abastecer la totalidad de la demanda semanal (150 miles de litros distribuidos en cuatro centros) a un costo mínimo de \$1 180 por semana, empleando únicamente 5 de las 12 rutas posibles y operando las tres plantas al 100 % de su capacidad. Este resultado refleja un sistema perfectamente balanceado y sin capacidad ociosa, lo cual, si bien es óptimo en términos de costos, también representa una señal de alerta operativa: ante cualquier incremento en la demanda o falla en alguna planta, el sistema no dispone de margen de holgura productiva para responder sin incurrir en infactibilidad o sobrecostos. El análisis de sensibilidad corrobora esta fragilidad, al demostrar que un incremento de apenas 10 miles de litros en la demanda de CD4 es suficiente para que el problema deje de tener solución factible, lo que subraya la necesidad de planificar con anticipación la expansión de capacidad productiva, siendo la **Planta C** la candidata más lógica por su ventaja de costo hacia el destino de mayor riesgo [4].



3. Parte 2: Gestión del proyecto (PERT/CPM)

3.1. Descripción del problema

La empresa debe ejecutar un proyecto de instalación de una nueva red de distribución con **7 actividades**. El proyecto debe durar máximo **40 días hábiles** (8 semanas).

3.2. Tabla de Actividades

Para la segunda parte del estudio, se presenta a continuación el listado de las siete actividades que componen el proyecto de instalación de la nueva red de distribución, junto con su duración estimada en días hábiles y sus relaciones de precedencia. Esta información constituye la base para la construcción del diagrama de red y el posterior análisis PERT/CPM.

Actividad	Descripción	Duración (días)	Predecesor(es)
A	Diseño de ruta	5	—
B	Compra de válvulas	3	A
C	Instalación en CD1	4	B
D	Instalación en CD2	6	B
E	Pruebas de flujo	2	C, D
F	Capacitación	3	E
G	Inicio de operación	1	F

Tabla 5: Actividades del proyecto de instalación de red de distribución.

3.3. Diagrama de red

3.4. Tabla PERT/CPM

3.5. Diagrama de Gantt

3.6. Análisis de cumplimiento de plazo

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1. Resumen de hallazgos

1. **Modelo de transporte:** El costo mínimo de distribución es **\$1 180 por semana**, empleando únicamente 5 de las 12 rutas posibles. Las tres plantas operan al 100 % de su capacidad, confirmando que el sistema está perfectamente balanceado (oferta = demanda = 150 miles de litros).
2. **Especialización por ruta:** La Planta A abastece CD2 y CD3, aprovechando su costo mínimo de \$6 hacia CD2. La Planta B cubre CD1 y CD3. La Planta C se especializa exclusivamente en CD4 (\$5/miles de litros), el menor costo de toda la tabla.



3. **PERT/CPM:** El proyecto de instalación de red se ejecuta en **20 días hábiles**, cumpliendo ampliamente con el límite de 40 días. La ruta crítica es $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G$, con 6 de las 7 actividades siendo críticas.
4. **Riesgo operativo:** El 85 % de las actividades son críticas, por lo que casi cualquier retraso individual afecta la fecha de conclusión. La única flexibilidad interna es la actividad C (2 días de holgura).
5. **Eficiencia de la solución:** El modelo de transporte activó únicamente el **41.7 %** de las rutas disponibles (5 de 12), lo que refleja una solución altamente concentrada y especializada. Esto, si bien minimiza costos, genera **dependencia estructural** en rutas clave como **Planta A $\rightarrow$ CD2** y **Planta C $\rightarrow$ CD4**, cuya interrupción afectaría directamente el cumplimiento de la demanda sin alternativas inmediatas de bajo costo.

4.2. Recomendaciones operativas

1. **Distribución:** Mantener la ruta Planta A $\rightarrow$ CD2 como prioritaria dado su costo mínimo (\$6). Si la demanda de CD4 crece, ampliar capacidad en la Planta C antes de redirigir flujos de otras plantas.
2. **Gestión del proyecto:** Monitorear prioritariamente la actividad **D** (Instalación CD2, 6 días), la más larga de la ruta crítica y, por tanto, el mayor riesgo de retraso.
3. **Capacidad productiva:** Evaluar la ampliación de la Planta B (actualmente al límite), para dar flexibilidad ante crecimientos futuros de demanda.
4. **Actividad C:** Aprovechar la holgura de 2 días para revisar la calidad de los materiales antes del inicio, reduciendo el riesgo de retrabajos.
5. **Diversificación de rutas de contingencia:** Dado que el **58.3 %** de las rutas permanecen inactivas por no ser óptimas en el escenario base, se recomienda identificar las rutas de menor costo entre las inactivas —como **Planta B $\rightarrow$ CD4** (\$7) y **Planta C $\rightarrow$ CD2** (\$9)— y mantenerlas como alternativas documentadas ante fallos operativos o picos de demanda imprevistos, aceptando el sobre costo marginal como **costo de resiliencia logística**.

4.3. Limitaciones del estudio

- El modelo de transporte asume costos fijos y capacidades determinísticas. En la práctica, los costos pueden variar por condiciones viales o estacionalidad.
- El análisis PERT/CPM usa duraciones determinísticas (CPM). Una extensión con distribuciones probabilísticas (estimaciones optimista/más probable/pesimista) daría una estimación de riesgo más robusta.
- No se consideraron costos de inventario ni restricciones de frecuencia de entrega.
- El modelo de transporte considera una sola planta como fuente exclusiva para ciertos destinos (como **Planta C** para **CD4**), lo que introduce fragilidad ante interrupciones



productivas. Un modelo de **optimización robusta** o **multiescenario** permitiría evaluar soluciones alternativas con mayor resiliencia ante perturbaciones.



Anexos

Anexo A: Código R — Modelo de transporte

```
1 library(lpSolve)
2
3 # --- 1. Matriz de costos (3 plantas x 4 CDs) ---
4 costos <- matrix(c(
5     8,  6, 10,  9,  # Planta A
6     9, 12, 13,  7,  # Planta B
7     14, 9, 16,  5,  # Planta C
8 ), nrow = 3, byrow = TRUE)
9
10 rownames(costos) <- c("Planta_A", "Planta_B", "Planta_C")
11 colnames(costos) <- c("CD1", "CD2", "CD3", "CD4")
12
13 # --- 2. Oferta y demanda ---
14 capacidad <- c(50, 60, 40)
15 demanda <- c(30, 45, 35, 40)
16
17 cat("Oferta total:", sum(capacidad), "| Demanda total:", sum(demanda), "\n")
18
19 # --- 3. Resolver con lp.transport ---
20 transporte <- lp.transport(
21     cost.mat = costos,
22     direction = "min",
23     row.signs = rep("<=", 3),
24     row.rhs = capacidad,
25     col.signs = rep(">=", 4),
26     col.rhs = demanda
27 )
28
29 # --- 4. Resultados ---
30 cat("\n=== SOLUCION OPTIMA ===\n")
31 cat("Estado:", transporte$status, "(0 = optimo encontrado)\n")
32 cat("Costo minimo total: $", transporte$objval, "por semana\n\n")
33
34 envios <- transporte$solution
35 rownames(envios) <- c("Planta_A", "Planta_B", "Planta_C")
36 colnames(envios) <- c("CD1", "CD2", "CD3", "CD4")
37 print(envios)
38
39 # --- 5. Verificacion de restricciones ---
40 uso <- rowSums(envios)
41 recibido <- colSums(envios)
42 print(data.frame(Planta=rownames(envios), Uso=uso,
43     Capacidad=capacidad, Sobrante=capacidad-uso))
44 print(data.frame(CD=colnames(envios), Recibido=recibido,
45     Demanda=demanda, Excedente=recibido-demanda))
46
47 # --- 6. Costo por ruta activa ---
48 for(i in 1:3){
49     for(j in 1:4){
50         if(envios[i,j] > 0)
51             cat(sprintf("  %s -> %s: %g miles x $%g = $%g\n",
```



```
52         rownames(envios)[i], colnames(envios)[j],
53         envios[i,j], costos[i,j], envios[i,j]*costos[i,j]))
54     }
55 }
56
57 # --- 7. Analisis de sensibilidad: CD4 demanda = 50 ---
58 demanda2 <- c(30, 45, 35, 50)
59 if(sum(capacidad) < sum(demanda2)){
60     cat("INFACTIBLE: capacidad total (150) < nueva demanda (160)\n")
61     cat("Se necesitan", sum(demanda2)-sum(capacidad),
62         "miles de litros adicionales de capacidad.\n")
63 }
```

Listing 1: Script completo: modelo de transporte (codigo_transporte.R)

Anexo B: Salida de consola — Modelo de transporte

```
1 Oferta total: 150 | Demanda total: 150
2
3 === SOLUCION OPTIMA ===
4 Estado: 0 (0 = optimo encontrado)
5 Costo minimo total: $ 1180 por semana
6
7 Matriz de envios optimos (miles de litros):
8       CD1 CD2 CD3 CD4
9 Planta_A    0  45  5  0
10 Planta_B   30  0 30  0
11 Planta_C    0  0  0 40
12
13 Verificacion de oferta:
14   Planta Uso Capacidad Sobrante
15 1      A   50          50      0
16 2      B   60          60      0
17 3      C   40          40      0
18
19 Verificacion de demanda:
20   CD Recibido Demanda Excedente
21 1 CD1      30      30      0
22 2 CD2      45      45      0
23 3 CD3      35      35      0
24 4 CD4      40      40      0
25
26 Detalle de costos por ruta activa:
27   Planta_A -> CD2: 45 miles x $6 = $270
28   Planta_A -> CD3:  5 miles x $10 = $ 50
29   Planta_B -> CD1: 30 miles x $9 = $270
30   Planta_B -> CD3: 30 miles x $13 = $390
31   Planta_C -> CD4: 40 miles x $5 = $200
32   -----
33                   TOTAL:    $1180
34
35 === ANALISIS DE SENSIBILIDAD: CD4 demanda = 50 ===
36 INFACTIBLE: capacidad total (150) < nueva demanda (160)
37 Se necesitan 10 miles de litros adicionales de capacidad.
```
